

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Bài tập thực hành LAB 4,5
Môn học: Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Giảng viên: ThS. Phạm Trọng Huynh

Sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Phú Thọ

Mã SV: 1150080158

Lớp: 11_ĐHCNPM_2

MỤC LỤC


I. Theo dõi tiến độ

1. Lưu đường cơ sở của kế hoạch của bạn

Kịch bản: Tại một Nhà xuất bản Trẻ, kế hoạch ra mắt sách mới hiện đã được xây dựng đầy đủ. Công việc thực tế về dự án sẽ sớm bắt đầu. Để cho phép so sánh sau này giữa công việc thực tế và lịch trình hiện tại với kế hoạch ban đầu, trước tiên bạn sẽ lưu một đường cơ sở.

Trong bài tập này, bạn lưu trạng thái hiện tại của lịch biểu làm đường cơ sở và sau đó xem xét các giá trị nhiệm vụ đường cơ sở.

1. Bạn tạo tập tin và đặt tên là “Simple Tracking_Start.mpp”, nội dung file theo các Task bên dưới, để hoàn thành bài tập này.
2. Trên tab “Project”, trong nhóm “Schedule”, bấm “Set Baseline”, rồi bấm “Set Baseline...”. Hộp thoại Set Baseline xuất hiện.

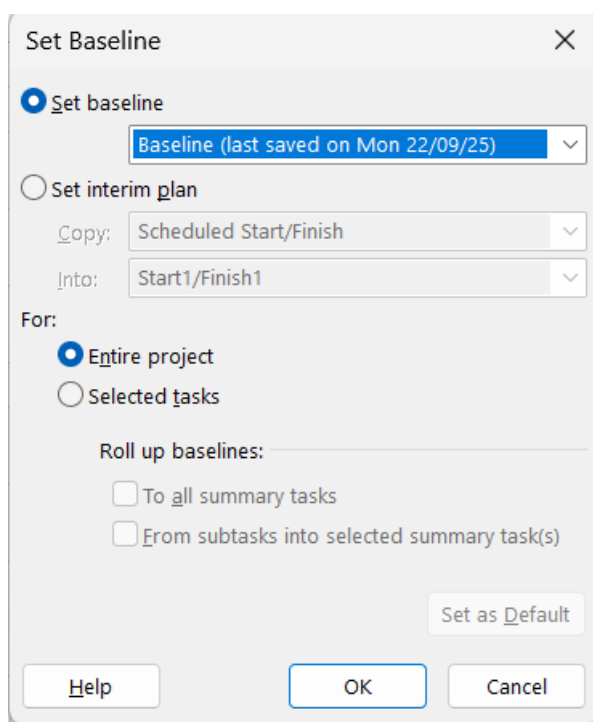

Bạn sẽ đặt đường cơ sở cho toàn bộ kế hoạch bằng cách sử dụng cài đặt mặc định của hộp thoại.

3. Nhấp vào OK.

Dự án lưu đường cơ sở, mặc dù không có dấu hiệu nào trong khung nhìn Biểu đồ Gantt rằng mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ bạn sẽ thấy một số thay đổi do việc lưu đường cơ sở.

4. Trên tab “Task”, trong nhóm “View”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới “Gantt Chart”, rồi bấm “Task Sheet”.

Khung nhìn “Task Sheet” xuất hiện. Vì đây là khung nhìn dạng bảng, nó không bao gồm biểu đồ Gantt, nên sẽ có nhiều không gian để xem các trường trong bảng Entry.

Bây giờ bạn sẽ chuyển sang bảng phương sai “Variance” trong khung nhìn Task Sheet. Bảng phương sai “Variance” là một trong số các bảng được xác định trước bao gồm các giá trị đường cơ sở.


5. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables”.

Trong các bảng được liệt kê, lưu ý dấu check bên cạnh Entry. Điều này có nghĩa là bảng Entry hiện đang được hiển thị trong khung nhìn Task Sheet. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển sang một bảng khác.

6. Bấm vào “Variance”.

Task	Task Name	Start	Finish	Baseline Start	Baseline Finish	Start Var.	Finish Var.
1	Simple Tracking_Start	Mon 22/09/2025	Mon 22/09/25	NA	NA	0 days	0 days
2	Giai đoạn lập kế hoạch	Mon 22/09/25	Mon 13/10/25	NA	NA	0 days	0 days
3	Chỉ định các thành viên trong nhóm phát hành	Mon 22/09/25	Fri 26/09/25	NA	NA	0 days	0 days
4	Hoàn thành bảng câu hỏi về tác giả	Mon 22/09/25	Mon 29/09/25	NA	NA	0 days	0 days
5	Lên lịch phỏng vấn tác giả	Mon 22/09/25	Fri 10/10/25	NA	NA	0 days	0 days
6	Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị	Tue 23/09/25	Mon 13/10/25	NA	NA	0 days	0 days
7	Lập kế hoạch hoàn tất	Mon 13/10/25	Mon 13/10/25	NA	NA	0 days	0 days

7. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Gantt Chart”. Khung nhìn biểu đồ Gantt xuất hiện.

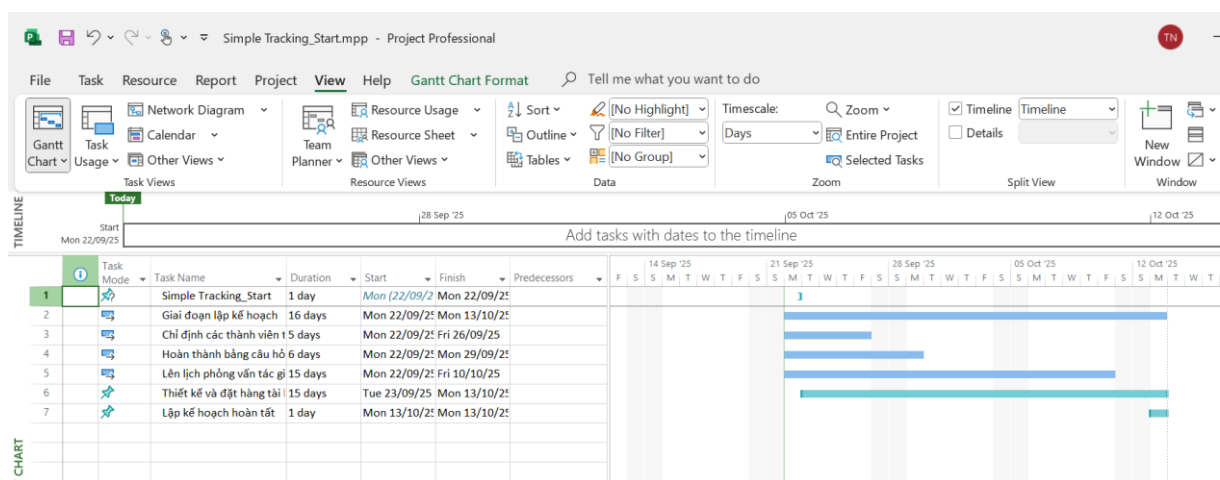

2. Theo dõi một kế hoạch như đã lên lịch đến một ngày cụ thể


Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, một thời gian đã trôi qua kể từ khi lưu đường cơ sở trong kế hoạch ra mắt sách mới. Công việc đã được hoàn thành trong 1.5 tuần đầu tiên, như kế hoạch. Bạn cần tính đến những công việc đã hoàn thành trong kế hoạch.

Trong bài tập này, bạn theo dõi kế hoạch theo lịch trình đến một ngày cụ thể, dẫn đến việc Dự án ghi lại các thông tin thực tế của dự án.

1. Trên tab “Project”, trong nhóm “Status”, bấm cập nhật dự án “Update Project”.


Hộp thoại cập nhật dự án xuất hiện.

2. Đảm bảo rằng tùy chọn “Update work as complete through” được chọn. Trong hộp liên kết, nhập hoặc chọn ngày

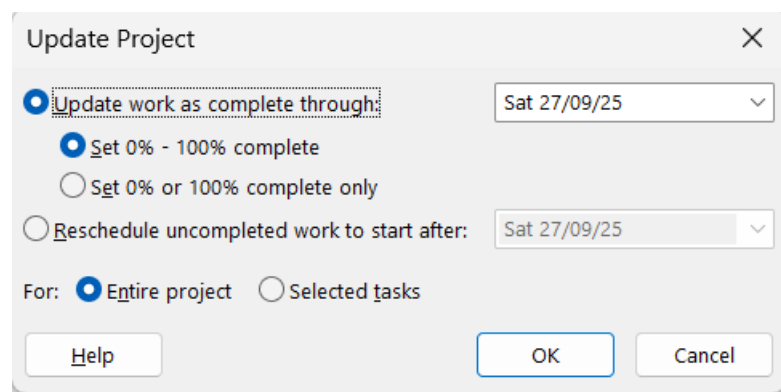

3. Nhấp vào OK.

Dự án ghi lại tỷ lệ phần trăm hoàn thành cho các nhiệm vụ được lên lịch bắt đầu trước ngày 14 tháng 1. Nó hiển thị tiến trình đó bằng cách vẽ các thanh tiến trình (progress bars) trong các thanh Gantt cho các nhiệm vụ đó.

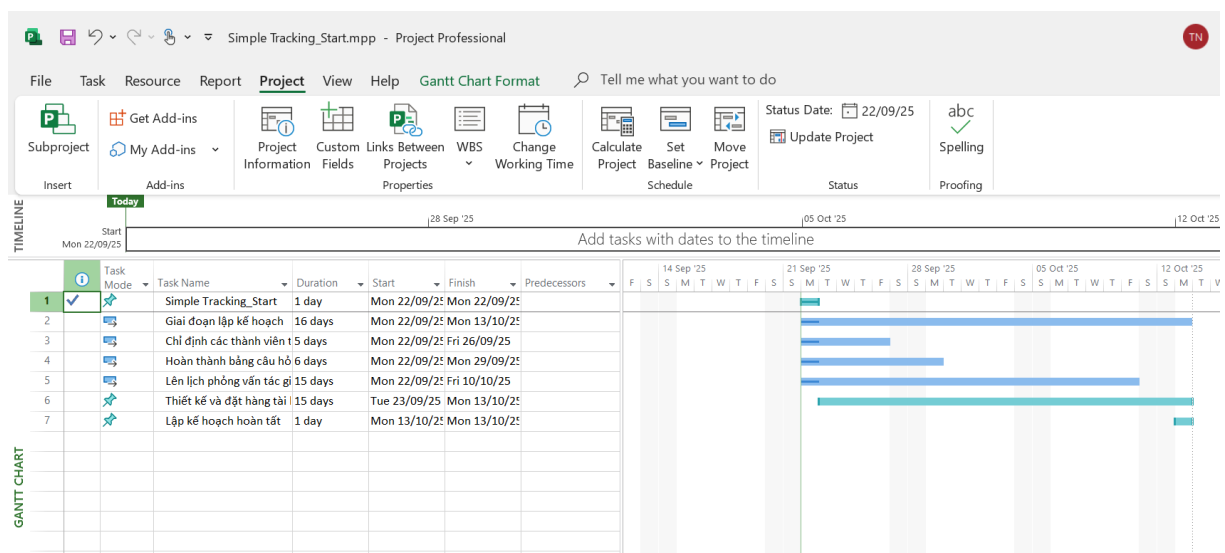

3. Nhập tỷ lệ phần trăm hoàn thành nhiệm vụ


Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, công việc ra mắt cuốn sách mới vẫn tiếp tục. Bạn có tiến độ bổ sung để ghi vào kế hoạch dưới dạng giá trị phần trăm hoàn thành.

Trong bài tập này, bạn ghi lại tỷ lệ phần trăm hoàn thành của một số nhiệm vụ.


1. Trong cột “Task Name”, hãy chọn tên của nhiệm vụ 5, Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị. Hiện tại, nhiệm vụ này đạt một phần tiến độ nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Quan sát thanh Gantt để xem sự thay đổi sau khi thực hiện bước kế tiếp.

2. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 100% Complete. Dự án ghi lại công việc thực tế cho nhiệm vụ theo lịch trình và mở rộng thanh tiến trình suốt chiều dài của thanh Gantt. Quan sát thanh Gantt để thấy sự thay đổi so với bước trên.

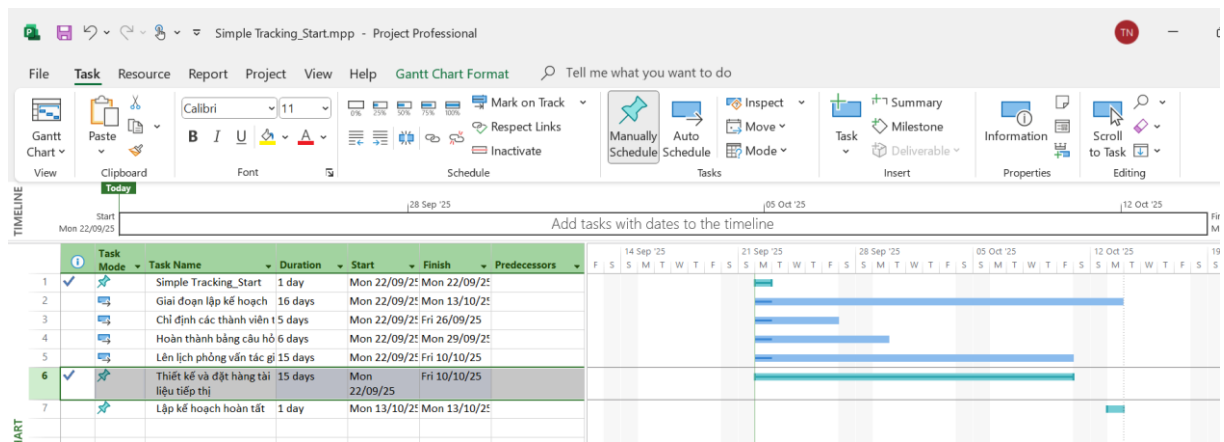


4. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 100% Complete.

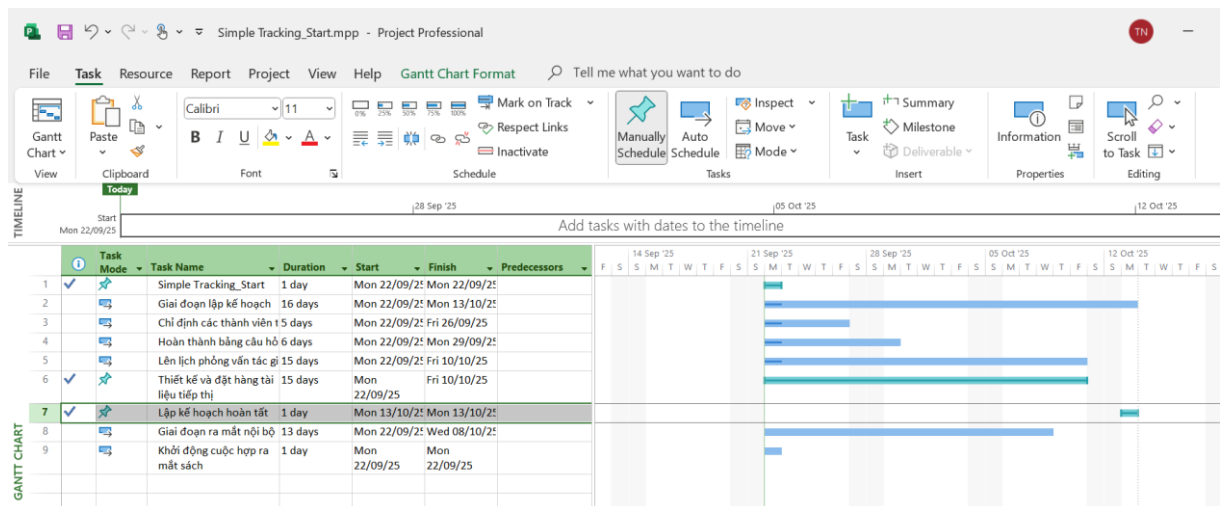

5. Nhấp vào tên của nhiệm vụ 9, Soạn báo cáo lời – lỗi về sách.

6. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 50% Complete.

Dự án ghi lại công việc thực tế cho nhiệm vụ theo lịch trình và sau đó vẽ thanh tiến độ thông qua một phần của thanh Gantt.

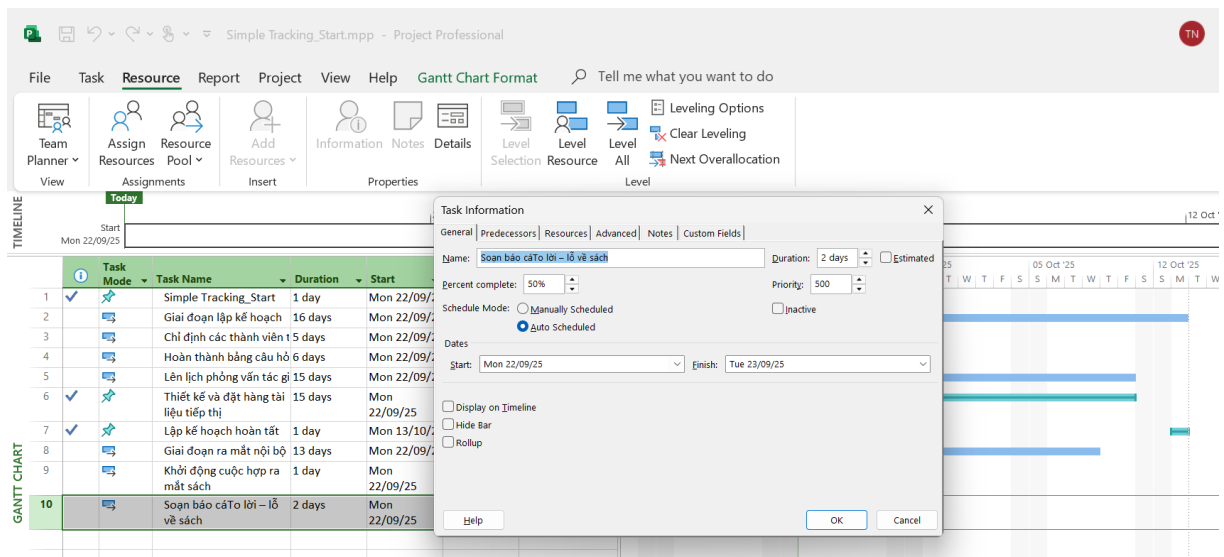


7. Trong phần biểu đồ (ở bên phải) trong khung nhìn Biểu đồ Gantt, giữ con trỏ chuột trên thanh tiến độ trong thanh Gantt của nhiệm vụ 9. Khi con trỏ chuột thay đổi thành biểu tượng phần trăm và mũi tên phải, một lưu ý màn hình tiến độ “Progress ScreenTip” sẽ xuất hiện.

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, một vài ngày nữa đã trôi qua và công việc ra mắt sách mới đã được tiến hành. Các nguồn lực thực hiện công việc đã cung cấp cho bạn tiến độ thực tế có phần khác so với kế hoạch, đồng thời bạn muốn ghi lại những thông tin thực tế này và quan sát hiệu quả của kế hoạch tổng thể.

Trong bài tập này, bạn ghi lại các giá trị công việc thực tế cho một số nhiệm vụ, cũng như thời lượng và ngày bắt đầu thực tế cho các nhiệm vụ khác.

1. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables” rồi bấm “Work”.
- Bảng Work xuất hiện.
2. Nếu cần, hãy kéo thanh chia dọc sang bên phải để hiển thị cột cuối cùng trong bảng công việc “Work”, % W. Comp (% công việc hoàn thành).
 3. Trong trường “Actual” cho nhiệm vụ 9, Soạn báo cáo lời – lỗi về sách, nhập hoặc chọn 24, rồi nhấn Enter.

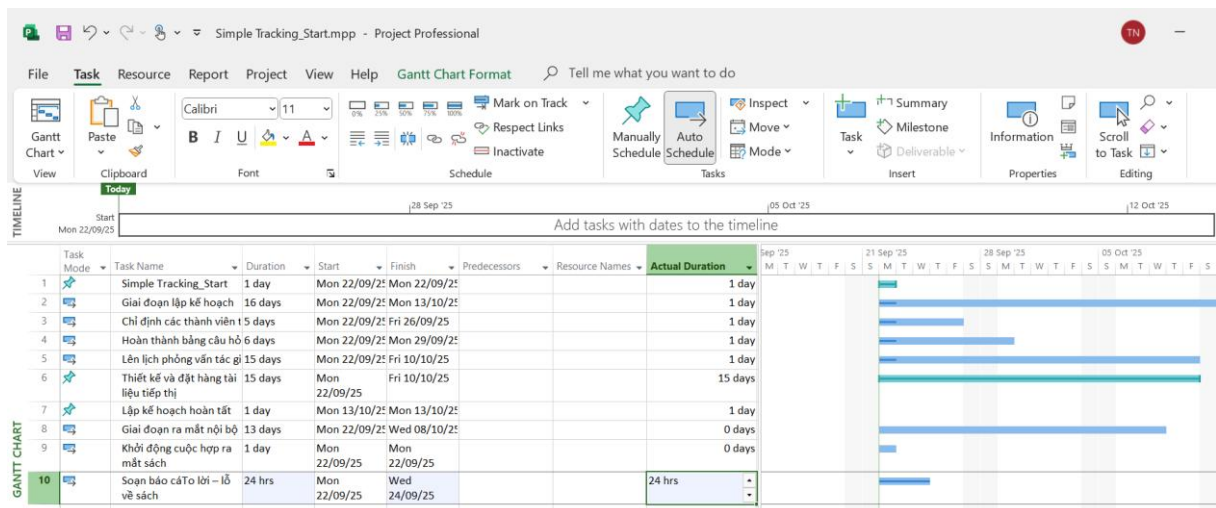

Dự án ghi lại rằng 24 giờ làm việc đã được hoàn thành cho nhiệm vụ 9. Vì 24 giờ lớn hơn 16 giờ được lên lịch ban đầu (hiển thị trong trường cơ sở (Baseline) của nhiệm vụ), Dự án đánh dấu nhiệm vụ là đã hoàn thành và mở rộng thanh Gantt của nhiệm vụ để cho biết thời lượng dài hơn của nó.

4. Trong cột “Task Name”, nhấp vào nhiệm vụ 10, Lập kế hoạch cho hành trình của tác giả.

Nhiệm vụ này bắt đầu trước một ngày làm việc so với kế hoạch (thứ Ba trước ngày bắt đầu dự kiến) và mất tổng cộng bảy ngày để hoàn thành. Bạn sẽ ghi lại thông tin này trong hộp thoại “Update Task”.

5. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm vào mũi tên xuống ở bên phải của nút đánh dấu theo dõi “Mark on Track”, rồi bấm cập nhật nhiệm vụ “Update Tasks”.

Hộp thoại “Update Task” xuất hiện. Hộp thoại này hiển thị cả giá trị thực tế và giá trị đã lên lịch cho thời lượng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của nhiệm vụ cũng như thời lượng còn lại của nó. Trong hộp này, bạn có thể cập nhật các giá trị thực tế và các giá trị còn lại.

6. Trong trường “Start” trong nhóm “Actual” ở bên trái hộp thoại, nhập hoặc chọn 20/10/25.

7. Trong trường thời lượng thực tế “Actual dur”, nhập hoặc chọn 7d.

h Pred

22/09/25

13/10/25

5/09/25

29/09/25

0/10/25

0/10/25

13/10/25

08/10/25

9/25

0 days

24 hrs

Sep '25

21 Sep '25

F S S M T

Update Tasks

Name: Lập kế hoạch cho hành trình của Duration: 1d?

% Complete: 100% Actual dur: 7d Remaining dur: 0d?

Actual

Start: Mon 22/09/25

Finish: Mon 22/09/25

Current


Start: Mon 22/09/25

Finish: Mon 22/09/25

Help Notes... OK Cancel

8. Nhấp vào OK.

Dự án ghi lại ngày bắt đầu thực tế, thời lượng và công việc thực tế và dự kiến của nhiệm vụ. Các giá trị này cũng được tổng hợp vào nhiệm vụ tóm tắt Giai đoạn ra mắt nội bộ (nhiệm vụ 7) và nhiệm vụ tóm tắt dự án (nhiệm vụ 0), như được chỉ ra bởi phần đánh dấu thay đổi.

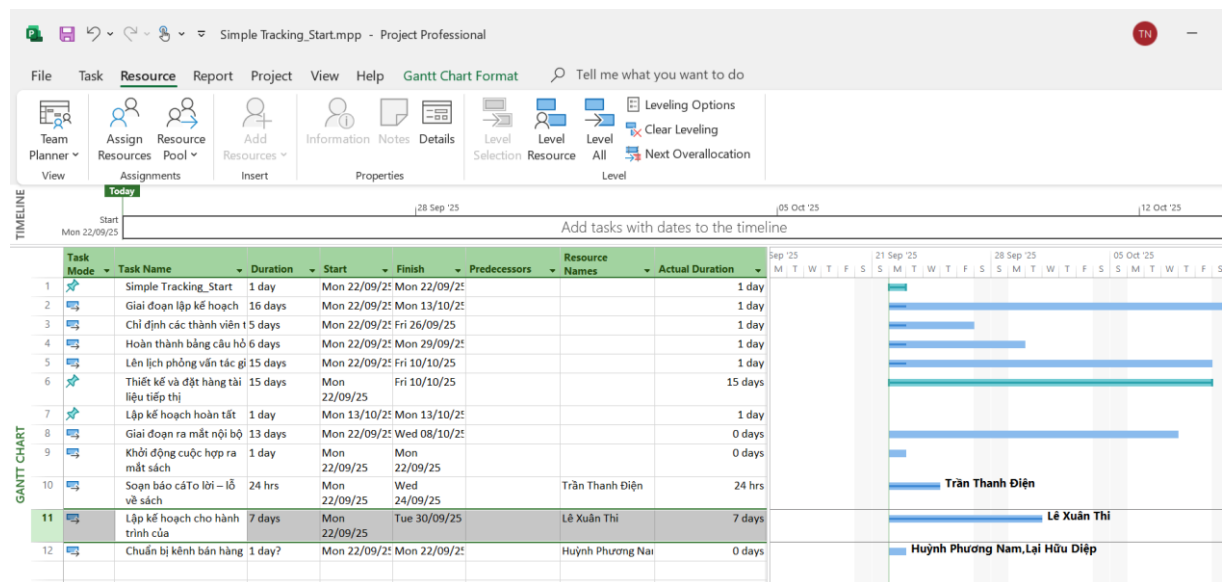

II. Theo dõi tiến độ các nhiệm vụ và phân công

1. Cập nhật đường cơ sở


Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, việc lập kế hoạch cho dự án sách mới dành cho trẻ em đã trải qua một số điều chỉnh bổ sung. Điều này bao gồm một số điều chỉnh đối với thời lượng nhiệm vụ và một nhiệm vụ mới trong giai đoạn Sự tiếp nhận. Do những thay đổi này, bạn cần phải nắm bắt một đường cơ sở mới trước khi công việc bắt đầu.

Trong bài tập này, bạn so sánh kế hoạch được lên lịch hiện tại với kế hoạch cơ sở và cập nhật đường cơ sở cho kế hoạch.

1. Tạo tập tin thứ 2, dựa vào Task bên dưới, đặt tên “Advanced Tracking A_Start.mpp”, để hoàn thành bài tập này.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task View”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới nút “Gantt Chart” rồi bấm “Tracking Gantt”.

Khung nhìn Tracking Gantt xuất hiện.

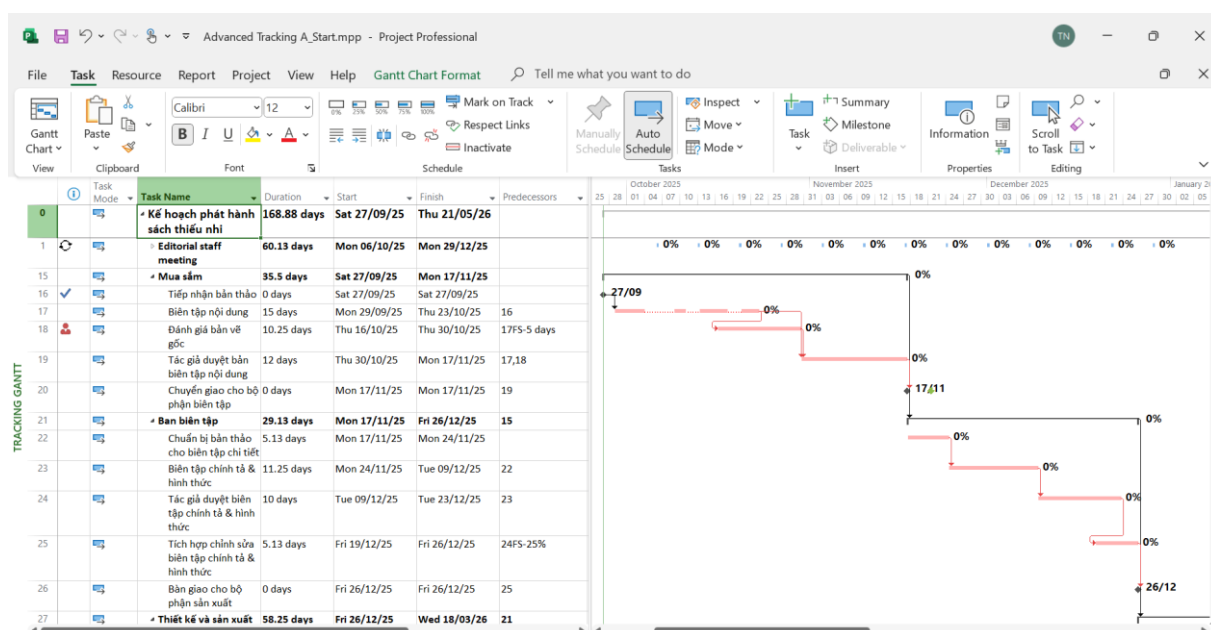

3. Trong cột “Task Name”, nhấn tên của nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc.


4. Trên tab “Task” trong nhóm chỉnh sửa “Editing”, bấm di chuyển đến tác vụ “Scroll to Task”.

Khung nhìn Tracking Gantt cuộn để hiển thị thanh Gantt cho nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc. Nhiệm vụ này đã được thêm vào kế hoạch sau khi đường cơ sở ban đầu đã được lưu. Như bạn có thể thấy trong khung nhìn Tracking Gantt, nhiệm vụ này không có thanh đường cơ sở, cho biết rằng nó không có giá trị đường cơ sở. Ngoài ra,

thời lượng của nhiệm vụ bổ sung đã dịch chuyển các nhiệm vụ kế nhiệm ra khỏi các đường cơ sở của chúng.

Để có cái nhìn bao quát hơn về đường cơ sở của kế hoạch, bạn sẽ điều chỉnh mức thu phóng (zoom).


5. Trên tab “View”, trong nhóm thu phóng “Zoom”, trong hộp thang thời gian “Timescale”, bấm “Weeks”. Bạn có thể thấy rằng hiện tại không có nhiệm vụ nào sau này trong kế hoạch phù hợp với các đường cơ sở của chúng.

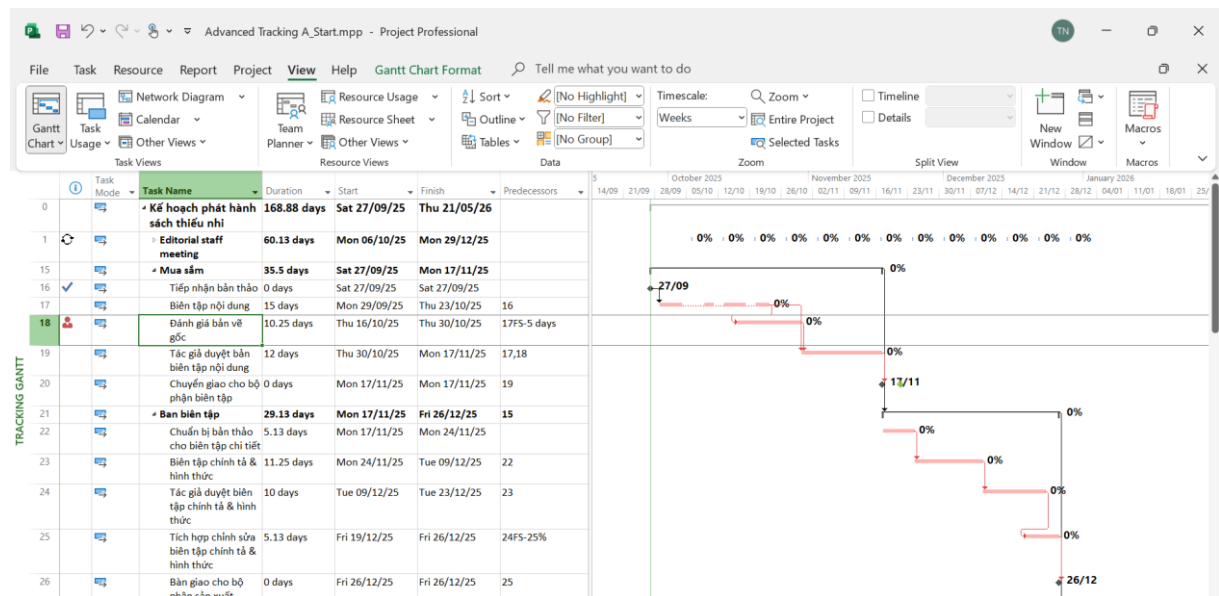

6. Trên tab dự án “Project”, trong nhóm lịch biểu “Schedule”, bấm thiết lập đường cơ sở

“Set Baseline”, rồi bấm “Set Baseline...”. Hộp thoại thiết lập đường cơ sở xuất hiện.


7. Đảm bảo rằng tùy chọn “Set Baseline” được chọn. Trong vùng “For”, đảm bảo rằng tùy chọn “Entire project” được chọn. Lưu ý rằng ngày lưu lần cuối “last saved” mà bạn thấy có thể khác.

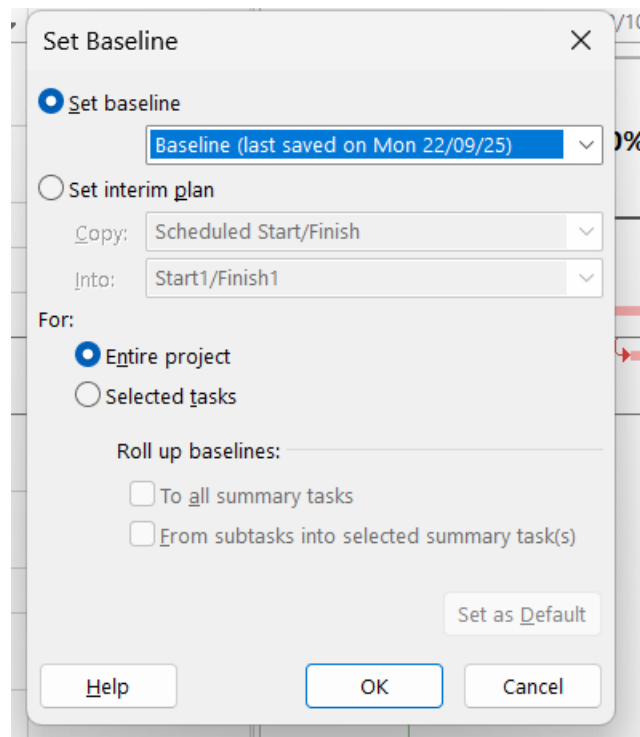

8. Nhấn OK để cập nhật đường cơ sở.

Dự án cảnh báo bạn rằng bạn sắp ghi đè lên các giá trị đường cơ sở đã lưu trước đó.

9. Nhấn Yes.

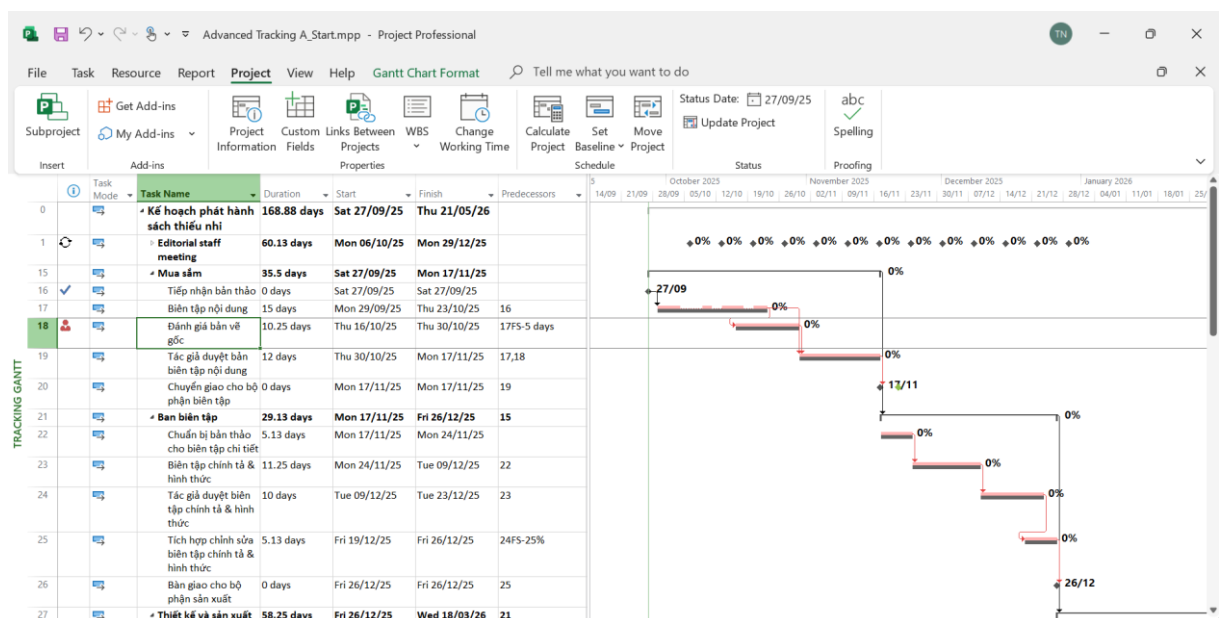

Nhiệm vụ 18 hiện có một đường cơ sở, và tất cả các giá trị đường cơ sở của các nhiệm vụ khác hiện khớp với các giá trị đã lên lịch của chúng.

10. Đóng tập tin “Advanced_Tracking A_Start.mpp”.

2. Theo dõi dựa trên tổng giá trị công việc thực tế cho từng nhiệm vụ và phân công

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, một số nhiệm vụ trong kế hoạch sách mới cho trẻ em có nhiều hơn một tài nguyên được phân giao. Để có cái nhìn rõ hơn về cách bạn ghi lại công việc thực tế cho các nhiệm vụ như vậy ảnh hưởng đến công việc được giao, bạn sẽ chuyển sang khung nhìn “Task Usage” và sau đó ghi lại các thực tế.

1. Tạo tiếp tập tin mới, dựa vào Task bên dưới, đặt tên là “Advanced Tracking B_Start.mpp”, để hoàn thành bài tập này.

Phiên bản này của kế hoạch bao gồm các giá trị đường cơ sở được cập nhật đã lưu trước đó, cũng như các thực tế đầu tiên được báo cáo dựa trên các nhiệm vụ đầu tiên trong giai đoạn Sự tiếp nhận.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Task Usage”.

Khung nhìn “Task Usage” xuất hiện. Khung nhìn “Task Usage” liệt kê các tài nguyên trong các nhiệm vụ mà chúng được phân giao cho những nhiệm vụ đó. Thông tin này xuất hiện trong bảng bên trái. Ở phía bên phải, bạn thấy các dòng được sắp xếp theo thang thời gian. Các dòng hiển thị những giá trị công việc đã lên lịch cho từng nhiệm vụ hoặc tài nguyên được phân công; dòng nhiệm vụ có nền bóng mờ và dòng phân công có nền trắng.

3. Trong cột “Task Name”, nhấn tên của nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc.

4. Trên tab “Task”, trong nhóm “Editing”, bấm “Scroll to Task”.

Lưới phân đoạn thời gian ở bên phải của khung nhìn sẽ hiển thị công việc đã lên lịch đầu tiên cho nhiệm vụ.

Tiếp theo, bạn sẽ chuyển đổi bảng và các chi tiết được hiển thị trong khung nhìn.

5. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables” rồi bấm “Work”.

Bảng Work xuất hiện.

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.
0 • Lịch xuất bản sách thiếu nhi	2,317.5 hrs	2,317.5 hrs	0 hrs	235 hrs	2,082.5 hrs	10%
1 • Editorial staff meeting	45.5 hrs	45.5 hrs	0 hrs	7 hrs	38.5 hrs	15%
15 • Tiếp nhận bản thảo	444 hrs	444 hrs	0 hrs	228 hrs	216 hrs	51%
16 • Đã nhận bản thảo	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%
17 • Biên tập nội dung	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%
Nguyễn Minh Qu	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%
18 • Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	108 hrs	56 hrs	66%
Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	62 hrs	20 hrs	76%
Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	46 hrs	36 hrs	56%
19 • Tác giả duyệt biên tập nội dung	160 hrs	160 hrs	0 hrs	0 hrs	160 hrs	0%
Người biên tập n	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%
Đinh Thị Hồng Ni	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%
20 • Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%

Bảng này bao gồm các cột công việc thực tế (Actual Work) và công việc còn lại (Remaining Work) mà bạn sẽ làm việc trong thời gian ngắn, mặc dù chúng có thể chưa hiển thị. Các giá trị trong cột công việc (Work) là tổng các phân công và nhiệm vụ cho công việc đã lên lịch. Lưu ý rằng giá trị công việc của mỗi nhiệm vụ là tổng các giá trị công việc phân công của nó. Ví dụ, tổng công việc cho nhiệm vụ 18 (164 giờ) là tổng của 82 giờ làm việc của Huỳnh Phương Nam và 82 giờ của Lê Xuân Thy cho nhiệm vụ.

Tiếp theo, bạn sẽ thay đổi các chi tiết được hiển thị trên lưới phân đoạn thời gian ở phía bên phải của khung nhìn.

6. Trên tab định dạng “Format”, trong nhóm chi tiết “Details”, bấm công việc thực tế “Actual Work”.

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.
0 • Lịch xuất bản sách thiếu nhi	2,317.5 hrs	2,317.5 hrs	0 hrs	235 hrs	2,082.5 hrs	10%
1 • Editorial staff meeting	45.5 hrs	45.5 hrs	0 hrs	7 hrs	38.5 hrs	15%
15 • Tiếp nhận bản thảo	444 hrs	444 hrs	0 hrs	228 hrs	216 hrs	51%
16 • Đã nhận bản thảo	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%
17 • Biên tập nội dung	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%
Nguyễn Minh Qu	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%
18 • Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	108 hrs	56 hrs	66%
Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	62 hrs	20 hrs	76%
Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	46 hrs	36 hrs	56%
19 • Tác giả duyệt biên tập nội dung	160 hrs	160 hrs	0 hrs	0 hrs	160 hrs	0%
Người biên tập n	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%
Đinh Thị Hồng Ni	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%
20 • Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%

Đối với mỗi nhiệm vụ và phân công, Dự án hiện hiển thị các dòng công việc (Work)

và công việc thực tế (Actual Work) trên lưới phân đoạn thời gian ở phía bên phải của khung nhìn.

7. Sử dụng chuột, kéo thanh chia dọc sang phải cho đến khi bạn có thể nhìn thấy tất cả các cột trong bảng công việc “Work”.

Advanced Tracking B_Start.mpp - Project Professional

File Task Resource Report Project View Help **Task Usage Format** Tell me what you want to do

Format Gridlines Insert Column Columns Columns Details Show/Hide Assignment

Task Name Work Baseline Variance Actual Remaining % W. Comp. Add New Column

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Add New Column	Details	T	W	T	F	S	S	26 Apr '15	M	T	W	T
0 • Lịch xuất bản sách thiếu nhi	2,317.5 hrs	2,317.5 hrs	0 hrs	235 hrs	2,082.5 hrs	10%		Work	8h	8h	20h	24h				26.5h	24h	24h	18h
1 • Editorial staff meeting	45.5 hrs	45.5 hrs	0 hrs	7 hrs	38.5 hrs	15%		Work	8h	8h	20h	24h				3.5h	24h	24h	18h
15 • Tiếp nhận bản thảo	444 hrs	444 hrs	0 hrs	228 hrs	216 hrs	51%		Work	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h
16 • Đã nhận bản thảo	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%		Work	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h
17 • Biên tập nội dung	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%		Work	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h
Nguyễn Minh Qu	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%		Work	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h
18 • Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	108 hrs	56 hrs	66%		Work			12h	16h				16h	16h	16h	16h
Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	62 hrs	20 hrs	76%		Work			6h	8h				8h	8h	8h	8h
Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	46 hrs	36 hrs	56%		Work			6h	8h				8h	8h	8h	8h
19 • Tác giả duyệt biên tập nội dung	160 hrs	160 hrs	0 hrs	0 hrs	160 hrs	0%		Work			6h	8h				8h	8h	8h	8h
Người biên tập r	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%		Work			6h	8h				8h	8h	8h	8h
Dinh Thị Hồng Ni	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%		Work											
20 • Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%		Work											

8. Trong cột “Actual” cho nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc, nhập hoặc nhấn 92h, rồi nhấn phím Enter.

Advanced Tracking B_Start.mpp - Project Professional

File Task Resource Report Project View Help **Task Usage Format** Tell me what you want to do

Format Gridlines Insert Column Columns Columns Details Show/Hide Assignment

Task Name Work Baseline Variance Actual Remaining % W. Comp. Add New Column

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Add New Column	Details	T	W	T	F	S	S	26 Apr '15	M	T	W	T
0 • Lịch xuất bản sách thiếu nhi	2,317.5 hrs	2,317.5 hrs	0 hrs	219 hrs	2,098.5 hrs	9%		Work	8h	8h	20h	24h				26.5h	24h	24h	18h
1 • Editorial staff meeting	45.5 hrs	45.5 hrs	0 hrs	7 hrs	38.5 hrs	15%		Work	8h	8h	20h	24h				3.5h	24h	24h	18h
15 • Tiếp nhận bản thảo	444 hrs	444 hrs	0 hrs	212 hrs	232 hrs	48%		Work	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h
16 • Đã nhận bản thảo	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%		Work	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h
17 • Biên tập nội dung	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%		Work	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h
Nguyễn Minh Qu	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%		Work	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h
18 • Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	92 hrs	72 hrs	56%		Work			12h	16h				16h	16h	16h	16h
Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	46 hrs	36 hrs	56%		Work			12h	16h				16h	16h	16h	16h
Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	46 hrs	36 hrs	56%		Work			6h	8h				8h	8h	8h	8h
19 • Tác giả duyệt biên tập nội dung	160 hrs	160 hrs	0 hrs	0 hrs	160 hrs	0%		Work			6h	8h				8h	8h	8h	8h
Người biên tập r	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%		Work			6h	8h				8h	8h	8h	8h
Dinh Thị Hồng Ni	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%		Work											
20 • Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%		Work											

9. Trong cột “Actual” cho nhiệm vụ 18 của Lê Anh Tuấn nhập hoặc nhấn 62 giờ, rồi nhấn Enter.

Advanced Tracking B_Start.mpp - Project Professional

File Task Resource Report Project View Help Task Usage Format Tell me what you want to do

Text Styles Gridlines Insert Column Settings Columns Custom Fields Columns Details Show/Hide Assignment Information Notes

Work Baseline Work Outline Number Project Summary Task Cumulative Work Cost Actual Cost Summary Tasks

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Details	T	W	T	F	S	26 Apr '15	S	M	T	W	T
0 • Lịch xuất bản sách thiếu nhi	2,317.5 hrs	2,317.5 hrs	0 hrs	235 hrs	2,082.5 hrs	10%	Work	8h	8h	20h	24h				26.5h	24h	24h	18h
1 • Editorial staff meeting	45.5 hrs	45.5 hrs	0 hrs	7 hrs	38.5 hrs	15%	Act. Wc	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h
15 • Tiếp nhận bản thảo	444 hrs	444 hrs	0 hrs	228 hrs	216 hrs	51%	Work	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h
16 • Đã nhận bản thảo	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h
17 • Biên tập nội dung	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%	Work	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h
Nguyễn Minh Qu	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h
18 • Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	108 hrs	56 hrs	66%	Work	8h	8h	12h	16h				16h	16h	16h	16h
Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	62 hrs	20 hrs	76%	Act. Wc	8h	8h	12h	16h				16h	16h	16h	16h
Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	46 hrs	36 hrs	56%	Work	6h	8h	8h	8h				8h	8h	8h	8h
19 • Tác giả duyệt biên tập nội dung	160 hrs	160 hrs	0 hrs	0 hrs	160 hrs	0%	Act. Wc	6h	8h	8h	8h				8h	8h	8h	8h
Người biên tập n	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%	Work	6h	8h	8h	8h				8h	8h	8h	8h
Dinh Thị Hồng Ni	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%	Act. Wc	6h	8h	8h	8h				8h	8h	8h	8h
20 • Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%	Work	6h	8h	8h	8h				8h	8h	8h	8h
	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%	Act. Wc	6h	8h	8h	8h				8h	8h	8h	8h

10. Kéo thanh phân chia dọc trở lại bên trái để xem thêm các giá trị theo phân đoạn thời gian được cập nhật cho nhiệm vụ.

Advanced Tracking B_Start.mpp - Project Professional

File Task Resource Report Project View Help Task Usage Format Tell me what you want to do

Text Styles Gridlines Insert Column Settings Columns Custom Fields Columns Details Show/Hide Assignment Information Notes

Work Baseline Work Outline Number Project Summary Task Cumulative Work Cost Actual Cost Summary Tasks

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Details	M	T	W	T	F	S	26 Apr '15	S	M	T	W	T	F
0 • Lịch xuất bản sách thiếu nhi	2,317.5 hrs	2,317.5 hrs	0 hrs	235 hrs	2,082.5 hrs	10%	Work	10.5h	8h	8h	20h	24h				26.5h	24h	24h	18h	16h
1 • Editorial staff meeting	45.5 hrs	45.5 hrs	0 hrs	7 hrs	38.5 hrs	15%	Act. Wc	10.5h	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h	8h
15 • Tiếp nhận bản thảo	444 hrs	444 hrs	0 hrs	228 hrs	216 hrs	51%	Work	3.5h								3.5h				
16 • Đã nhận bản thảo	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	3.5h												
17 • Biên tập nội dung	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%	Work	7h	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h	16h
Nguyễn Minh Qu	120 hrs	120 hrs	0 hrs	120 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	7h	8h	8h	20h	24h				23h	24h	24h	18h	8h
18 • Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	108 hrs	56 hrs	66%	Work	7h	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h	
Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	62 hrs	20 hrs	76%	Act. Wc	7h	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h	
Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	46 hrs	36 hrs	56%	Work	7h	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h	
19 • Tác giả duyệt biên tập nội dung	160 hrs	160 hrs	0 hrs	0 hrs	160 hrs	0%	Act. Wc	7h	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h	
Người biên tập n	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%	Work	7h	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h	
Dinh Thị Hồng Ni	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%	Act. Wc	7h	8h	8h	8h	8h				7h	8h	8h	2h	
20 • Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%	Work	6h	8h	8h	8h	8h				6h	8h	8h	8h	8h
	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%	Act. Wc	6h	8h	8h	8h	8h				6h	8h	8h	8h	8h

11. Đóng tập tin “Advanced Tracking B_Start.mpp”.

3. Theo dõi dựa trên giá trị công việc thực tế theo phân đoạn thời gian của từng nhiệm vụ và phân công

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, giai đoạn Sự tiếp nhận trong kế hoạch sách mới dành cho trẻ em đã được hoàn thành, và giai đoạn Biên tập mới bắt đầu. Do một số lượng lớn các tài nguyên có liên quan và sự thay đổi của công việc biên tập, những nhiệm vụ này là những nhiệm vụ rủi ro nhất cho đến hiện nay trong dự án. Để quản lý các thực tế của những nhiệm vụ này một cách chi tiết nhất có thể, bạn sẽ ghi lại các thực

tế theo phân đoạn thời gian.


Trong bài tập này, bạn nhập một số thực tế cho các nhiệm vụ, cho các phân công và cho các khoảng thời gian cụ thể.

1. Tạo mới tập tin, đặt tên “Advanced Tracking C_Start.mpp”, dựa vào Task bên dưới để hoàn thành bài tập này.
2. Nhấn mũi tên mở rộng/thu gọn bên cạnh nhiệm vụ 15, Sự tiếp nhận, để thu gọn giai đoạn này của kế hoạch.

Giai đoạn này của công việc đã được hoàn thành.

3. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Task Usage”.
4. Trong cột “Task Name”, bấm vào tên của nhiệm vụ 22, Sắp xếp bản thảo cho bản sao, sau đó, trên tab “Task”, trong nhóm “Editing”, bấm “Scroll to Task”.

Dự án cuộn lưới phân đoạn thời gian để hiển thị các giá trị công việc đã lên lịch đầu tiên của giai đoạn Biên tập.

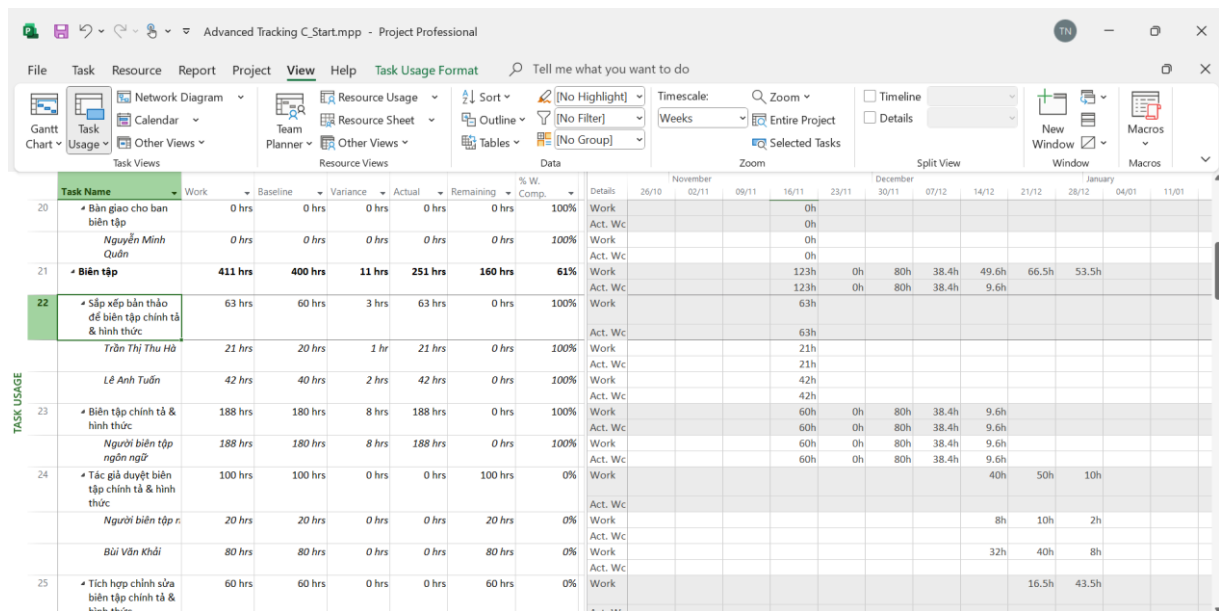

5. Trong lưới phân đoạn thời gian, hãy nhấn vào ô là giao điểm của cột Thứ Tư, ngày 25 tháng 9 và dòng công việc thực tế của nhiệm vụ 22. Dòng công việc thực tế nằm ngay bên dưới dòng công việc (chứa giá trị 1 weeks).

Timescale

Top Tier | Middle Tier | Bottom Tier | Non-working time

Middle tier formatting

Units: **Weeks** Label: 25 Jan '09 ☒ Use fiscal year

Count: 1 Align: Left ☒ Tick lines

Timescale options

Show: Two tiers (Middle, Bottom) Size: 100 % ☒ Scale separator

Preview

02 Nov '25 02/11	09 Nov '25 09/11	16 Nov '25 16/11	23 Nov '25 23/11	30 Nov '25 30/11	07 Dec '25 07/12	14 Dec '25 14/12

Help OK Cancel

Advanced Tracking C_Start.mpp - Project Professional

File Task Resource Report Project View Help Task Usage Format Tell me what you want to do

Task Views: Gantt Chart, Task Usage, Network Diagram, Calendar, Other Views

Resource Views: Resource Usage, Resource Sheet, Team Planner, Other Views

Task Usage

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Details	26 Oct '25 26/10	02 Nov '25 02/11	09 Nov '25 09/11	16 Nov '25 16/11	23 Nov '25 23/11	30 Nov '25 30/11	07 Dec '25 07/12	14 Dec '25 14/12	21 Dec '25 21/12	28 Dec '25 28/12	04 Jan '26 04/01
19	• Tác giả duyệt biên tập nội dung	184 hrs	160 hrs	24 hrs	184 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	40h	80h	64h							
	Người biên tập ngôn ngữ	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	12h	40h	40h							
	Bùi Văn Khải	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	28h	40h	24h							
20	• Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc										
	Nguyễn Minh Quân	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc										
21	• Biên tập	411 hrs	400 hrs	11 hrs	251 hrs	160 hrs	61%	Act. Wc										
22	• Sắp xếp bản thảo để biên tập chỉnh tả & hình thức	63 hrs	60 hrs	3 hrs	63 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc										
	Trần Thị Thu Hà	21 hrs	20 hrs	1 hr	21 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc										
	Lê Anh Tuấn	42 hrs	40 hrs	2 hrs	42 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc										
23	• Biên tập chỉnh tả & hình thức	188 hrs	180 hrs	8 hrs	188 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc										
	Người biên tập ngôn ngữ	188 hrs	180 hrs	8 hrs	188 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc										
24	• Tác giả duyệt biên tập chỉnh tả & hình thức	100 hrs	100 hrs	0 hrs	0 hrs	100 hrs	0%	Act. Wc										
	Người biên tập r	20 hrs	20 hrs	0 hrs	0 hrs	20 hrs	0%	Act. Wc										
	Bùi Văn Khải	80 hrs	80 hrs	0 hrs	0 hrs	80 hrs	0%	Act. Wc										
25	• Tích hợp chỉnh sửa biên tập chỉnh tả & hình thức	60 hrs	60 hrs	0 hrs	0 hrs	60 hrs	0%	Act. Wc										

Ngay sau khi bạn nhập giá trị thực tế đầu tiên cho nhiệm vụ, giá trị công việc đã lên lịch được thay đổi để khớp với nó. Cả giá trị công việc và công việc thực tế được tổng hợp thành các cấp nhiệm vụ tóm tắt và được phân phối giữa các phân công cụ thể cho nhiệm vụ. Bạn có thể thấy điều này xảy ra trong lưới phân đoạn thời gian ở bên phải và bảng ở bên trái.

7. Trong ô công việc thực tế thứ Năm, ngày 26 tháng 9, nhập 15h, rồi nhấn Tab.

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Details	26 Oct '23	02 Nov '23	09 Nov '23	16 Nov '23	23 Nov '23	30 Nov '23	07 Dec '23	14 Dec '23	21 Dec '23	28 Dec '23
18	Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	164 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	24h								
	Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	82 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	12h								
	Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	82 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	12h								
19	Tác giả duyệt biên tập nội dung	184 hrs	160 hrs	24 hrs	184 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	40h	80h	64h						
	Người biên tập ngôn ngữ	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	12h	40h	40h						
	Bùi Văn Khải	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	28h	40h	24h						
20	Bản giao cho bạn biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			0h						
	Nguyễn Minh Quân	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			0h						
21	Biên tập	450 hrs	400 hrs	50 hrs	290 hrs	160 hrs	64%	Act. Wc			123h	12h	92h	53.4h	9.6h		
22	Sắp xếp bản thảo để biên tập chỉnh tả & hình thức	102 hrs	60 hrs	42 hrs	102 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			63h	12h	12h	15h			
	Trần Thị Thu Hà	34 hrs	20 hrs	14 hrs	34 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			21h	4h	4h	5h			
	Lê Anh Tuấn	68 hrs	40 hrs	28 hrs	68 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			42h	8h	8h	10h			

Bước này kết thúc công việc thực tế được ghi lại ở cấp độ nhiệm vụ. Tiếp theo, bạn sẽ nhập các giá trị công việc thực tế của một nhiệm vụ ở cấp độ phân công. Đối với nhiệm vụ 23, Bản sao, bạn có các giá trị công việc thực tế hàng tuần từ tài nguyên được phân giao. Các biên tập viên đã hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ này, bạn sẽ điều chỉnh thang thời gian để ghi lại các giá trị thực tế hàng tuần.

9. Trên tab “View”, trong nhóm “Zoom”, trong hộp thang thời gian “Timescale”, bấm “Weeks”.

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Details	26/11	03/12	10/12	17/12	24/12	31/12	07/01	14/01	21/01	28/01
18	Duyệt tranh minh họa gốc	164 hrs	164 hrs	0 hrs	164 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
	Lê Anh Tuấn	82 hrs	82 hrs	0 hrs	82 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
	Phạm Ngọc Lan	82 hrs	82 hrs	0 hrs	82 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
19	Tác giả duyệt biên tập nội dung	184 hrs	160 hrs	24 hrs	184 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
	Người biên tập ngôn ngữ	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
	Bùi Văn Khải	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
20	Bản giao cho bạn biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
	Nguyễn Minh Quân	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc									
21	Biên tập	450 hrs	400 hrs	50 hrs	290 hrs	160 hrs	64%	Act. Wc			123h	12h	92h	53.4h	9.6h		
22	Sắp xếp bản thảo để biên tập chỉnh tả & hình thức	102 hrs	60 hrs	42 hrs	102 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			63h	12h	12h	15h			
	Trần Thị Thu Hà	34 hrs	20 hrs	14 hrs	34 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			21h	4h	4h	5h			
	Lê Anh Tuấn	68 hrs	40 hrs	28 hrs	68 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			42h	8h	8h	10h			
23	Biên tập chỉnh tả & hình thức	188 hrs	180 hrs	8 hrs	188 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			60h	0h	80h	38.4h	9.6h		
	Người biên tập ngôn ngữ	188 hrs	180 hrs	8 hrs	188 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc			60h	0h	80h	38.4h	9.6h		
24	Tác giả duyệt biên	100 hrs	100 hrs	0 hrs	0 hrs	100 hrs	0%	Act. Wc									

10. Nhập các giá trị công việc thực tế sau vào lưới phân đoạn thời gian cho phân công của các biên tập viên vào nhiệm vụ 23, Bản sao:

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.	Details	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01
19	Tác giả duyệt biên tập nội dung	184 hrs	160 hrs	24 hrs	184 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	40h	80h	64h							
	Người biên tập ngôn ngữ	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	12h	40h	40h							
	Bùi Văn Khải	92 hrs	80 hrs	12 hrs	92 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc	28h	40h	24h							
20	Bàn giao cho ban biên tập	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc				0h						
	Nguyễn Minh Quân	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc				0h						
21	Biên tập	498 hrs	400 hrs	98 hrs	338 hrs	160 hrs	68%	Act. Wc				123h	92h	60h	53.4h	9.6h		
22	Sắp xếp bản thảo để biên tập chỉnh tả & hình thức	102 hrs	60 hrs	42 hrs	102 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc				63h	12h	12h	15h			
	Trần Thị Thu Hà	34 hrs	20 hrs	14 hrs	34 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc				21h	4h	4h	5h			
	Lê Anh Tuấn	68 hrs	40 hrs	28 hrs	68 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc				42h	8h	8h	10h			
23	Biên tập chỉnh tả & hình thức	236 hrs	180 hrs	56 hrs	236 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc				60h	80h	48h	38.4h	9.6h		
	Người biên tập ngôn ngữ	236 hrs	180 hrs	56 hrs	236 hrs	0 hrs	100%	Act. Wc				60h	80h	48h	38.4h	9.6h		

Các giá trị công việc thực tế của tài nguyên đã được tổng hợp thành giá trị công việc thực tế của nhiệm vụ.

Các giá trị công việc ban đầu đã được lưu trong đường cơ sở trong trường hợp bạn cần tham khảo chúng sau này.

11. Đóng tập tin “Advanced Tracking C_Start.mpp”.

4. Lập lại lịch công việc chưa hoàn thành

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, công việc trong giai đoạn Biên tập của kế hoạch sách mới dành cho trẻ em đã được hoàn thành. Nhóm đã bắt đầu công việc cho giai đoạn tiếp theo, Thiết kế và Sản xuất. Tuy nhiên, bạn cần khắc phục sự cố trì hoãn công việc do sự cố không lường trước được.

Trong bài tập này, bạn sắp lại lịch cho các công việc chưa hoàn thành.

1. Tạo mới tập tin, đặt tên là “Advanced Tracking D_Start.mpp”, dựa vào Task bên dưới để hoàn thành bài tập này.

Kế hoạch hiện đang ở khung nhìn “Task Usage”. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển sang khung nhìn biểu đồ Gantt “Gantt Chart”.


2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới nút “Gantt Chart”, rồi bấm “Gantt Chart”.

3. Cuộn khung nhìn biểu đồ Gantt lên sao cho Đánh giá các trang lần thứ nhất (nhiệm vụ 30) xuất hiện gần đầu khung nhìn.

4. Trong cột “Task Name”, hãy bấm vào tên của nhiệm vụ 31, Hiệu đính và lập chỉ mục.

Nhiệm vụ 31, Hiệu đính và lập chỉ mục hiện có hai ngày làm việc thực tế đã hoàn

thành và vài ngày làm việc theo lịch trình còn lại.

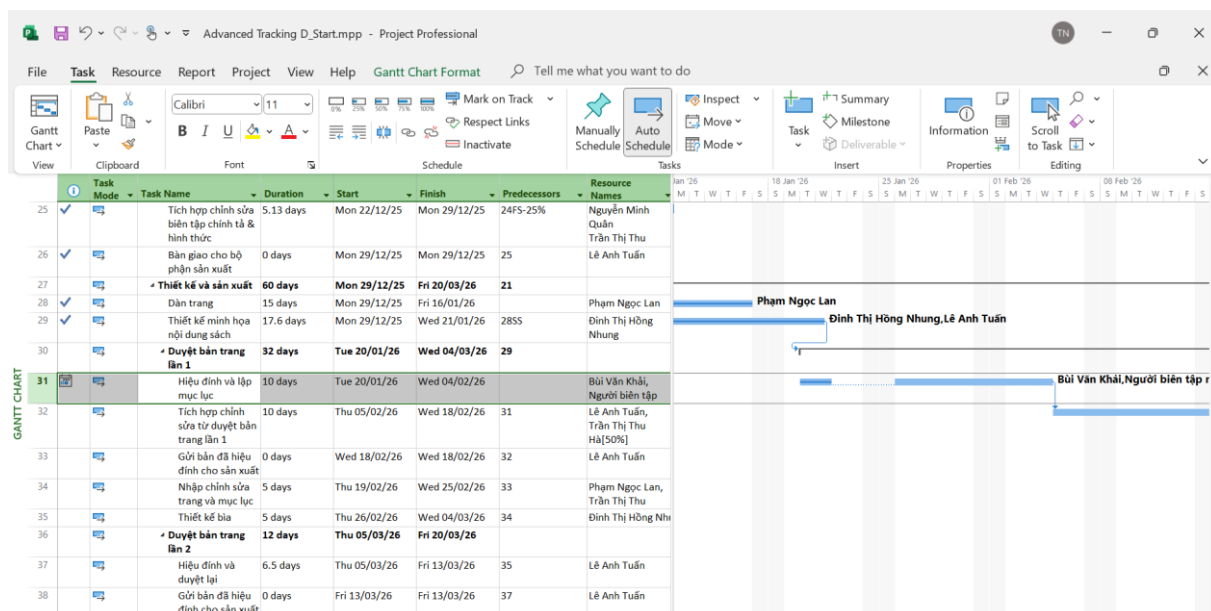

5. Trên tab “Project”, trong nhóm trạng thái “Status”, bấm cập nhật dự án “Update Project”.

Hộp thoại cập nhật dự án xuất hiện.

6. Chọn tùy chọn “Reschedule uncompleted work to start after” (lập lại lịch trình công việc chưa hoàn thành để bắt đầu sau) và trong hộp văn bản,

Update Project

☒ Update work as complete through: Sat 27/09/25

☒ Set 0% - 100% complete

☐ Set 0% or 100% complete only


☐ Reschedule uncompleted work to start after: Sat 27/09/25

For: ☒ Entire project ☐ Selected tasks

Help OK Cancel

7. Nhấn OK để đóng hộp thoại “Update Project”.

Dự án tách nhiệm vụ 31 sao cho phần chưa hoàn thành của nhiệm vụ được trì hoãn cho đến thứ Tư.

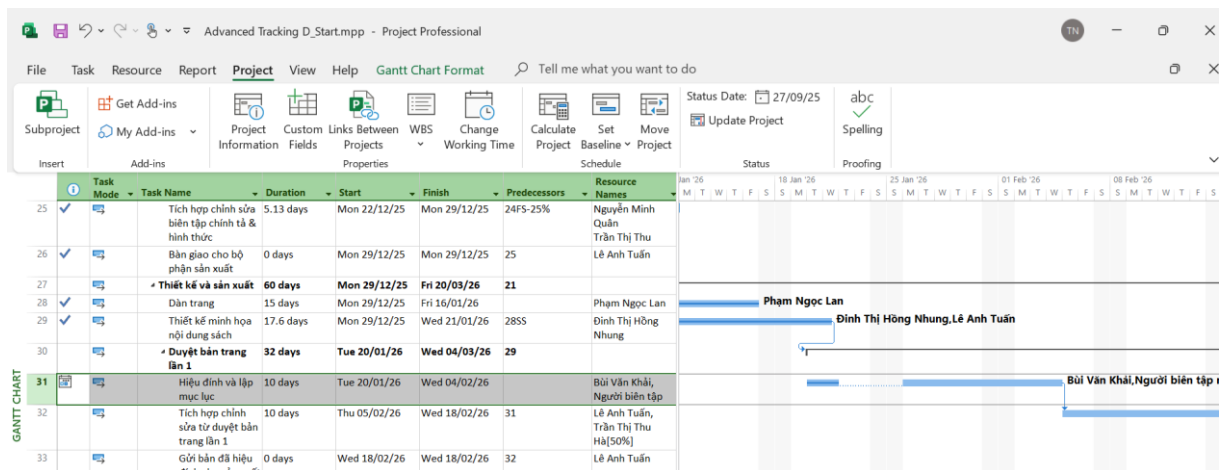

Như bạn có thể thấy, mặc dù thời lượng của nhiệm vụ 31 vẫn là 10 ngày làm việc, ngày kết thúc và các ngày bắt đầu tiếp theo cho những nhiệm vụ kế nhiệm đã bị đẩy ra sau. Mặc dù bạn đã giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng khi làm như vậy, bạn đã tạo ra các vấn đề khác trong phần còn lại của dự án. Bạn sẽ giải quyết vấn đề này và các vấn đề khác trong kế hoạch.

Dưới đây là một số điều khác cần ghi nhớ khi theo dõi tiến trình:

- Bạn có thể tắt khả năng lập lại lịch công việc chưa hoàn thành trên các nhiệm vụ mà với chúng bất kỳ công việc thực tế nào đã được ghi lại. Trên tab “File”, bấm vào “Options”. Trong hộp thoại “Project Options”, hãy bấm vào tab “Schedule”, sau đó, dưới nhãn “Scheduling Options For This Project”, hãy bỏ chọn checkbox “Split In-Progress Task”.

- Nếu bạn sử dụng ngày trạng thái để báo cáo các thực tế, Dự án hỗ trợ một số tùy chọn để kiểm soát cách các phân đoạn đã hoàn thành và chưa hoàn thành của một nhiệm vụ được lên lịch xung quanh ngày trạng thái. Bạn có thể xem các tùy chọn bằng cách thực hiện như sau: Trên tab “File”, bấm vào “Options”. Trong hộp thoại “Project Options”, bấm vào tab “Advanced”, sau đó, dưới nhãn “Calculation Options For This Project”, điều chỉnh thiết lập “Move End Of Completed Parts After Status Date Back To Status Date” và ba hộp checkbox khác bên dưới nó.

8. Đóng tập tin “Advanced Tracking D_Start.mpp”.
